

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年7月14日			
								一	二	三	四
1		安全监督管理系统（PC端）	36 days	2024年7月17日	2024年8月25日						
2		需求评审及需求文档Prd制作	5 days	2024年7月19日	2024年7月25日		颜秉政				
3		大屏设计、页面设计、小程序设计	6 days	2024年7月24日	2024年7月31日		毕晋琪				
4		双预防管控（二、三期）	5 days	2024年8月1日	2024年8月5日		刘成, 胡日				
5		安全生产管理规章制度管理	2 days	2024年8月1日	2024年8月2日		刘成, 胡日				
6		年度安全生产规划	1 day	2024年8月3日	2024年8月3日	5	刘成, 胡日				
7		安全生产目标责任书	1 day	2024年8月4日	2024年8月4日	6	刘成, 胡日				
8		安全生产责任考核	1 day	2024年8月5日	2024年8月5日	7	刘成, 胡日				
9		责任体系	5 days	2024年8月6日	2024年8月10日		刘成, 胡日				
10		年度重点任务	2 days	2024年8月6日	2024年8月7日	8	刘成, 胡日				
11		管理机构人员	1 day	2024年8月8日	2024年8月8日	10	刘成, 胡日				
12		安全生产责任制（二期）	1 day	2024年8月9日	2024年8月9日	11	刘成, 胡日				
13		安全检查（三期）	1 day	2024年8月10日	2024年8月10日	12	刘成, 胡日				
14		队伍建设（三期）	2 days	2024年8月11日	2024年8月12日		刘成, 胡日				
15		注安师档案管理	2 days	2024年8月11日	2024年8月12日	13	刘成, 胡日				
16		单元测试	5 days	2024年8月13日	2024年8月19日		付津, 颜秉政				
17		应急专项管理（二、三期）	6 days	2024年8月1日	2024年8月6日		周俊伟, 罗燕				
18		应急保障组织机构（二期）	2 days	2024年8月1日	2024年8月2日		周俊伟, 罗燕				
19		应急救援预案管理（二期）	1 day	2024年8月3日	2024年8月3日	18	周俊伟, 罗燕				
20		应急救援物资管理（三期）	1 day	2024年8月4日	2024年8月4日	19	周俊伟, 罗燕				
21		安全事故信息报送（三期）-需要对接路产					周俊伟, 罗燕				
22		安全生产专项活动（三期）	1 day	2024年8月5日	2024年8月5日	20	周俊伟, 罗燕				
23		污染防治管理（三期）	1 day	2024年8月6日	2024年8月6日	22	周俊伟, 罗燕				
24		应急资源管理（三期）	10 days	2024年8月7日	2024年8月16日		周俊伟, 罗燕				
25		应急专家管理	1 day	2024年8月7日	2024年8月7日		周俊伟, 罗燕				
26		应急处置力量	1 day	2024年8月8日	2024年8月8日	25	周俊伟, 罗燕				
27		应急装备	1 day	2024年8月9日	2024年8月9日	26	周俊伟, 罗燕				
28		应急物资	7 days	2024年8月10日	2024年8月16日		周俊伟, 罗燕				
29		物资/储备配置	1 day	2024年8月10日	2024年8月10日	27	周俊伟, 罗燕				
30		物资登记	1 day	2024年8月11日	2024年8月11日	29	周俊伟, 罗燕				
31		物资入库	1 day	2024年8月12日	2024年8月12日	30	周俊伟, 罗燕				
32		物资出库	1 day	2024年8月13日	2024年8月13日	31	周俊伟, 罗燕				

项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年7月14日			
								一	二	三	四
33		物资调拨	1 day	2024年8月14日	2024年8月14日	32	周俊伟, 罗燕				
34		物资盘点	1 day	2024年8月15日	2024年8月15日	33	周俊伟, 罗燕				
35		物资异常预警	1 day	2024年8月16日	2024年8月16日	34	周俊伟, 罗燕				
36		预案管理 (三期)	4 days	2024年8月10日	2024年8月13日		周俊伟, 罗燕				
37		预案结构化管理	2 days	2024年8月10日	2024年8月11日		周俊伟, 罗燕				
38		预案启动	1 day	2024年8月12日	2024年8月12日	37	周俊伟, 罗燕				
39		业务配置	1 day	2024年8月13日	2024年8月13日	38	周俊伟, 罗燕				
40		事件中心 (三期)	5 days	2024年8月14日	2024年8月18日		周俊伟, 罗燕				
41		事件接报	2 days	2024年8月14日	2024年8月15日	39	周俊伟, 罗燕				
42		应急任务管理	1 day	2024年8月16日	2024年8月16日	41	周俊伟, 罗燕				
43		实时作业	2 days	2024年8月17日	2024年8月18日	42	周俊伟, 罗燕				
44		应急演练 (二期)	3 days	2024年8月19日	2024年8月21日		周俊伟, 罗燕				
45		应急演练	2 days	2024年8月19日	2024年8月20日		周俊伟, 罗燕				
46		应急演练归档	1 day	2024年8月21日	2024年8月21日		周俊伟, 罗燕				
47		风险隐患管理 (二、三期)	5 days	2024年8月1日	2024年8月5日		王飞宇, 罗燕				
48		风险分级管控 (三期)	5 days	2024年8月1日	2024年8月5日		王飞宇, 罗燕				
49		风险单元	2 days	2024年8月1日	2024年8月2日		王飞宇, 罗燕				
50		风险辨识与评估	1 day	2024年8月3日	2024年8月3日	49	王飞宇, 罗燕				
51		风险管控清单	1 day	2024年8月4日	2024年8月4日	50	王飞宇, 罗燕				
52		风险统计	1 day	2024年8月5日	2024年8月5日	51	王飞宇, 罗燕				
53		安全文化 (三期)	8 days	2024年8月6日	2024年8月14日		王飞宇, 罗燕				
54		知识库类别维护	1 day	2024年8月6日	2024年8月6日		王飞宇, 罗燕				
55		知识录入与维护	2 days	2024年8月7日	2024年8月8日	54	王飞宇, 罗燕				
56		知识检索	1 day	2024年8月9日	2024年8月9日	55	王飞宇, 罗燕				
57		教育培训	1 day	2024年8月10日	2024年8月10日	56	王飞宇, 罗燕				
58		班主自管理	1 day	2024年8月11日	2024年8月11日	57	王飞宇, 罗燕				
59		合理化建议	1 day	2024年8月12日	2024年8月12日	58	王飞宇, 罗燕				
60		科技兴安	1 day	2024年8月13日	2024年8月13日	59	王飞宇, 罗燕				
61		安全会议	1 day	2024年8月14日	2024年8月14日	60	王飞宇, 罗燕				
62		安全生产教育培训	16 days	2024年8月1日	2024年8月16日		徐腾, 胡日				
63		员工安全档案	2 days	2024年8月1日	2024年8月2日		徐腾, 胡日				
64		教育培训管理	2 days	2024年8月3日	2024年8月4日	63	徐腾, 胡日				
65		培训归档查询	2 days	2024年8月5日	2024年8月6日	64	徐腾, 胡日				

项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年7月14日			
								一	二	三	四
66		安全生产考试管理	10 days	2024年8月7日	2024年8月16日		徐腾, 胡日				
72		综合管理 (二、三期)	6 days	2024年8月15日	2024年8月20日		王飞宇, 罗燕				
73		安全E月报 (三期)	2 days	2024年8月15日	2024年8月16日	15	王飞宇, 罗燕				
74		专项活动 (三期)	1 day	2024年8月16日	2024年8月17日	73	王飞宇, 罗燕				
75		设施管理 (三期) 数据对接开发	1 day	2024年8月18日	2024年8月18日		王飞宇, 罗燕				
76		企业管理	2 days	2024年8月19日	2024年8月20日	74	王飞宇, 罗燕				
77		系统管理 (对接用户中心接口)	2 days	2024年8月19日	2024年8月20日		徐腾, 胡日				
78		部门管理	2 days	2024年8月19日	2024年8月20日		徐腾, 胡日				
79		角色管理	2 days	2024年8月21日	2024年8月22日		徐腾, 胡日				
80		用户管理	2 days	2024年8月23日	2024年8月24日		徐腾, 胡日				
81		数据字典	2 days	2024年8月19日	2024年8月20日		王飞宇, 罗燕				
82		日志管理	2 days	2024年8月21日	2024年8月22日		罗燕, 王飞宇				
83		集成测试	5 days	2024年8月20日	2024年8月25日		付津, 颜秉政				
84		安全监督管理系统 (微信小程序端)	18 days	2024年8月7日	2024年8月24日		新增开发2名				
85		年度重点任务	2 days	2024年8月7日	2024年8月8日		新增开发2名				
86		工作布置	2 days	2024年8月7日	2024年8月8日		新增开发2名				
87		安全检查	6 days	2024年8月9日	2024年8月14日		新增开发2名				
91		应急任务	1 day	2024年8月13日	2024年8月13日		新增开发2名				
92		事件接报	1 day	2024年8月14日	2024年8月14日		新增开发2名				
93		应急物资	4 days	2024年8月17日	2024年8月20日		新增开发2名				
94		物资信息	1 day	2024年8月17日	2024年8月17日		新增开发2名				
95		物资入库	1 day	2024年8月18日	2024年8月18日		新增开发2名				
96		物资出库	1 day	2024年8月19日	2024年8月19日		新增开发2名				
97		物资盘点	1 day	2024年8月20日	2024年8月20日		新增开发2名				
98		消息公告	3 days	2024年8月23日	2024年8月25日		新增开发2名				
99		消息提示	1 day	2024年8月23日	2024年8月23日		新增开发2名				
100		代办事项	1 day	2024年8月24日	2024年8月24日	99	新增开发2名				
101		安全会议	1 day	2024年8月25日	2024年8月25日	100	新增开发2名				
102		我的	2 days	2024年8月23日	2024年8月24日		新增开发2名				
103		所属部门	2 days	2024年8月23日	2024年8月24日		新增开发2名				
104		角色信息	2 days	2024年8月23日	2024年8月24日		新增开发2名				
105		安全日志	2 days	2024年8月23日	2024年8月24日		新增开发2名				


项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年7月14日				
								一	二	三	四	
106		隐私政策	2 days	2024年8月23日	2024年8月24日		新增开发2名					
107		源代码提交及部署上线	1 day	2024年8月25日	2024年8月25日		刘成, 陈坤华					


项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

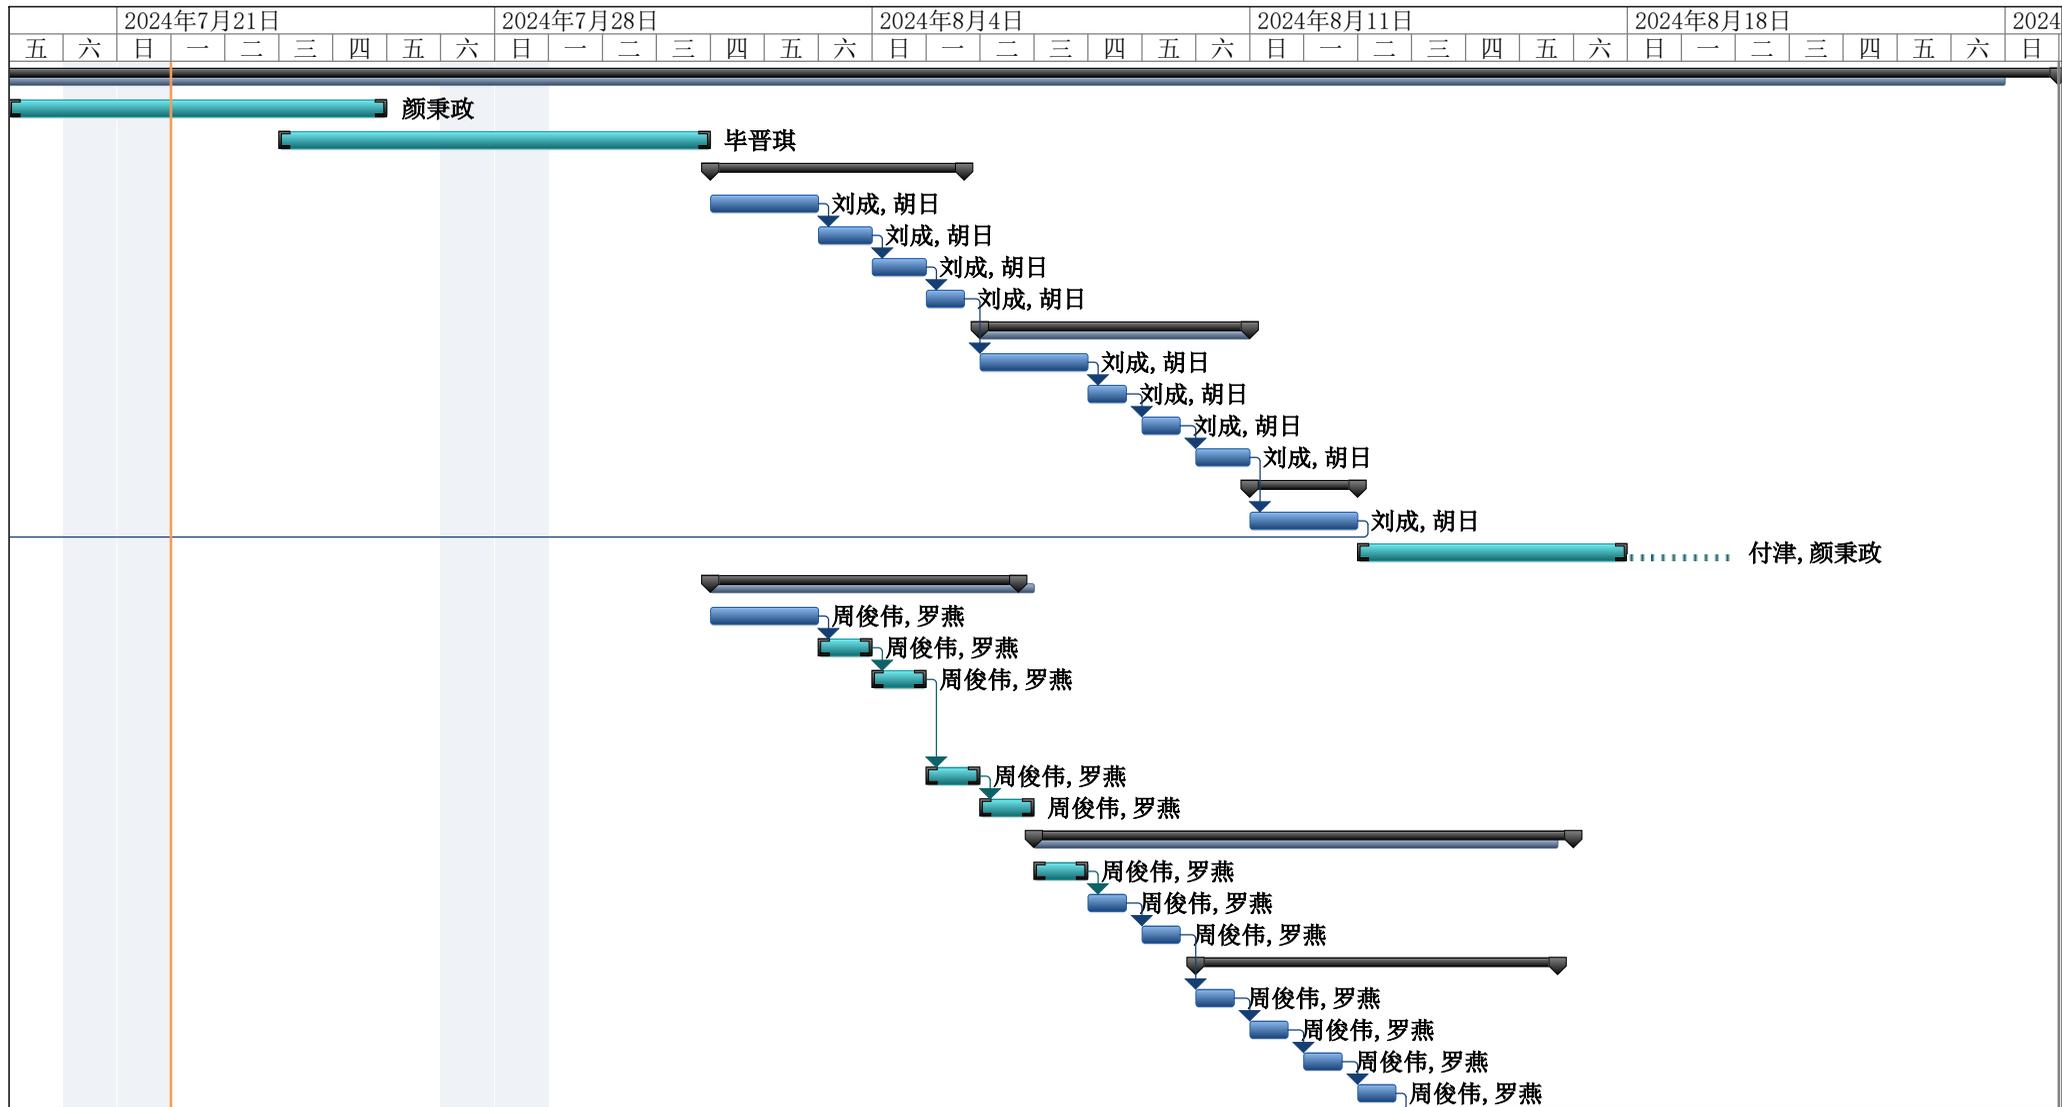


项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

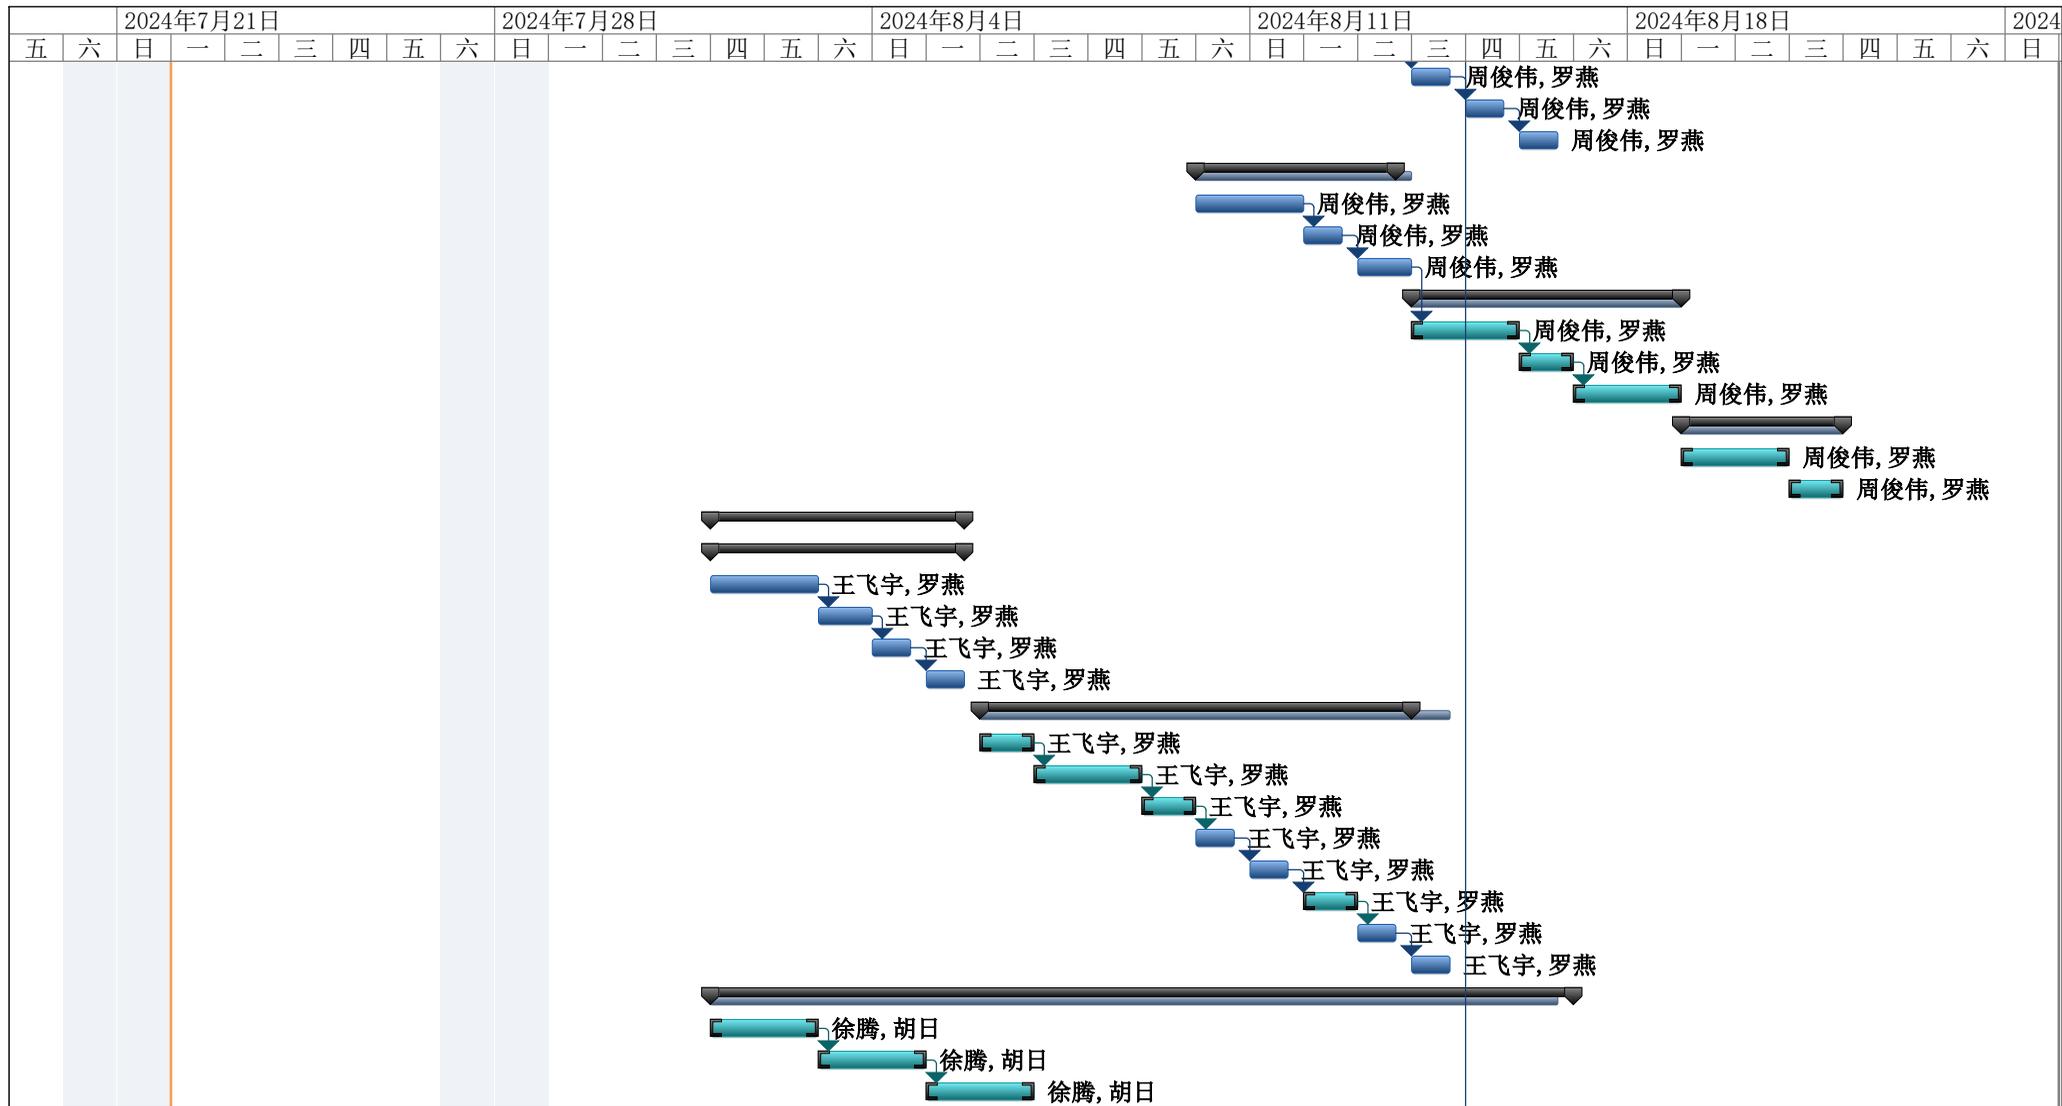

项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

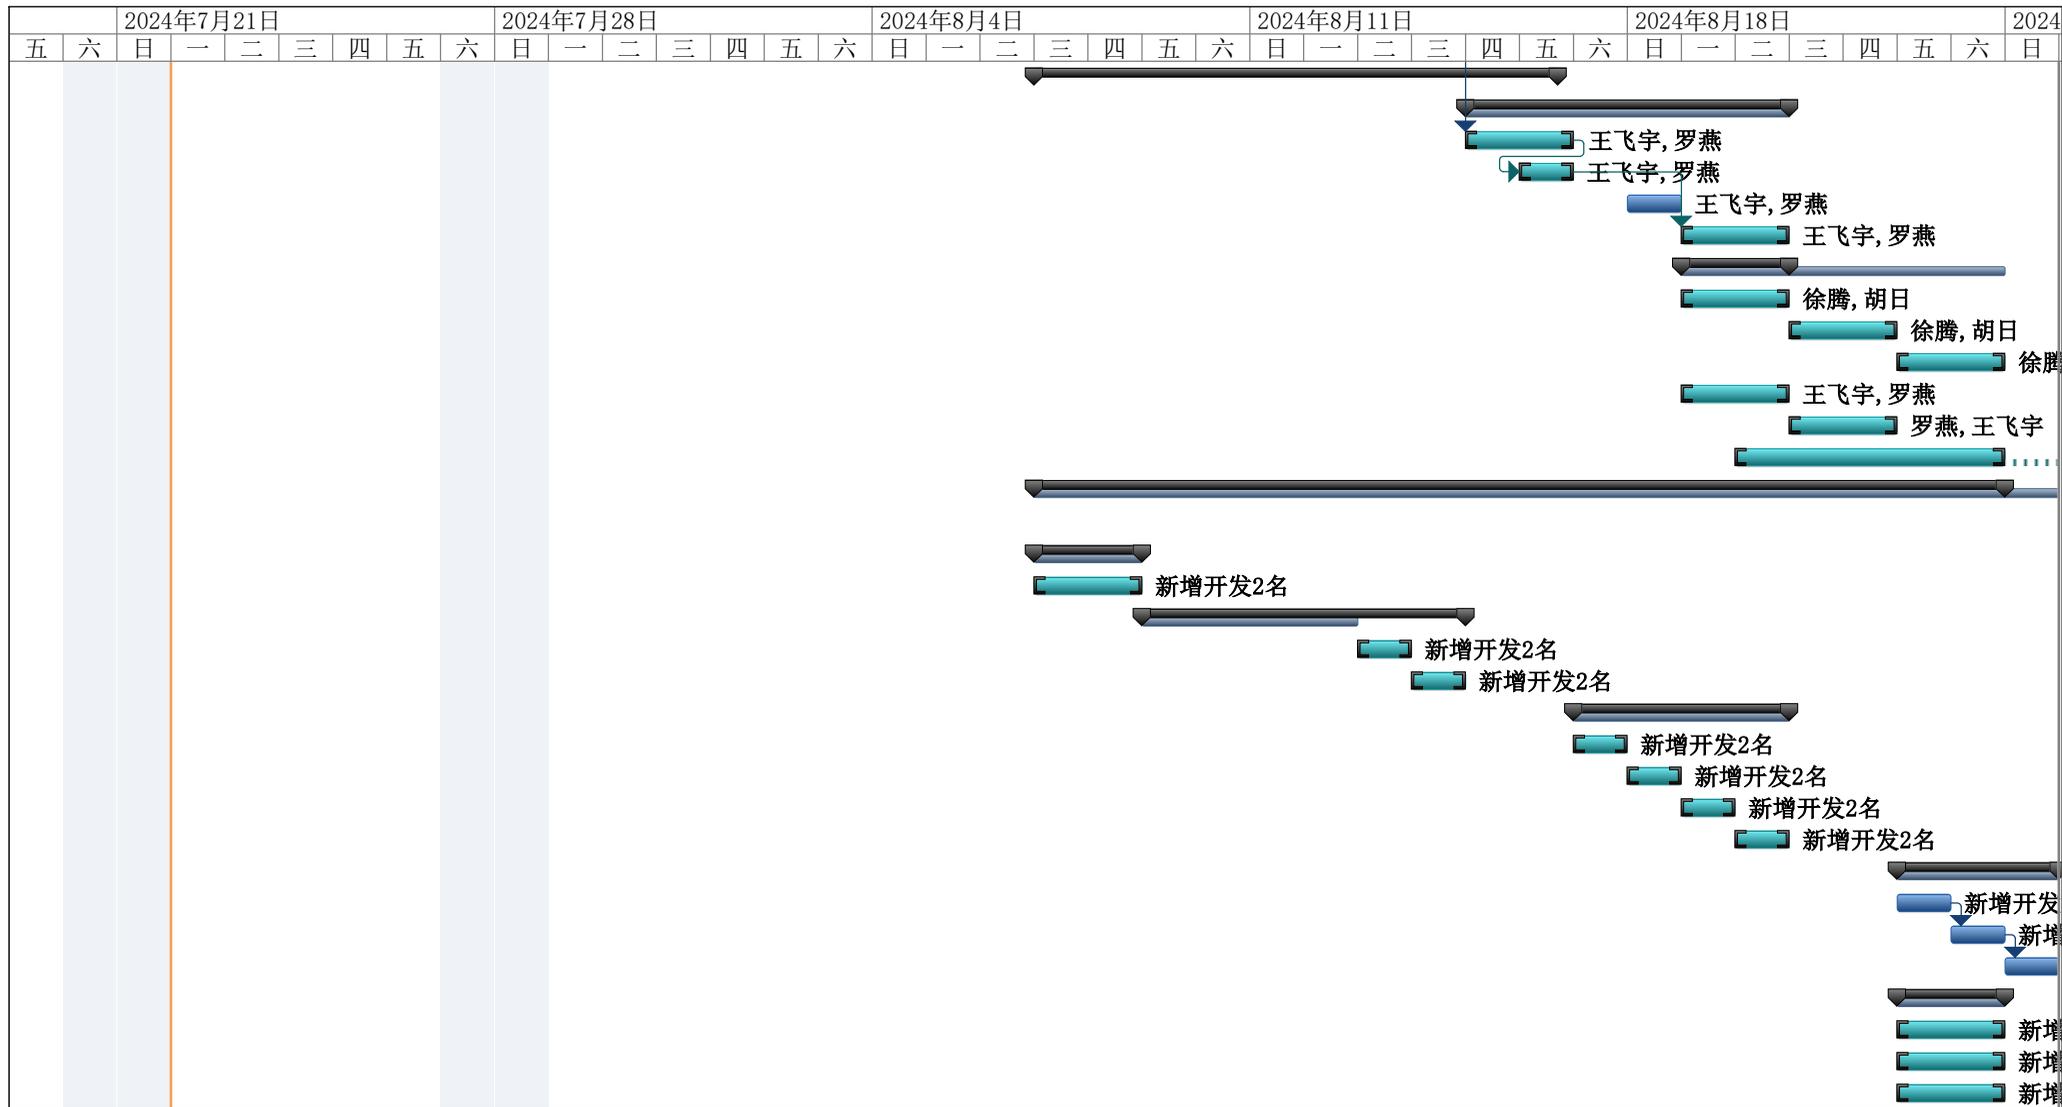

项目: msproj11  
日期: 2024年7月22日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

